



Deploy 09/10 vs. Major Release Salesforce 10/10

Análisis de Riesgo y Decisión de Release Management

Salesforce Admins



Desafío Crítico de Deploy y Upgrade

Mitigación de riesgos mediante convergencia estratégica y testing previo



Viernes 09/10

Deploy comprometido en una **fecha fija y no negociable**.



Sábado 10/10

Aplicación del **Major Release de Salesforce** al día siguiente.



Ventana del Sábado

Asegura **cero usuarios activos** en el sistema durante el proceso de upgrade.



Pruebas Exitosas

Testeado en **QA01 y PREPROD01** bajo Preview. Escenario más complejo validado.



Mitigación de Impacto: El fin de semana elimina por completo el impacto operativo de negocio durante la ventana de upgrade.

La validación post-release se ejecutará el **lunes 13/10** antes de la apertura de sucursales bancarias, garantizando un despliegue controlado y sin presión.

¿En qué versión está cada ambiente?

Estado del pipeline de ambientes de cara al próximo Major Release



Análisis de Equivalencias



INT01 es el único ambiente de la cadena que replica exactamente la versión actual de Producción. Por su parte, **QA01** y **PREPROD01** ya operan en la versión futura con el Major Release aplicado.

Rutas de Pase a Producción

Análisis comparativo de opciones para el upgrade de la plataforma

Nombre	Ruta Directa	★ Ruta Reforzada	Ruta Conservadora
Fecha de deploy	viernes 09/10	viernes 09/10	lunes 13/10
Cumple el compromiso	✓ Sí	✓ Sí	✗ No
Impacto en usuarios	Ninguno (sábado)	Ninguno (sábado)	Ninguno
Riesgo técnico	● Medio	● Bajo	● Muy bajo
Esfuerzo adicional	Ninguno	6-8 horas	Bajo técnico / Alto gestión
Validación post-upgrade	Reactiva – sin plan	Smoke test lunes 13/10 pre-apertura	N/A
Recomendación PS	✗ No recomendada	✓ RECOMENDADA	⚠ Solo si hay hallazgo crítico

i Nota: El 10/10 es sábado. En las 3 rutas el impacto de usuarios durante el upgrade es cero.

Ruta Directa — Ejecución estándar

Esta opción no es recomendada

Flujo Estándar de Ejecución

Flujo sin alteraciones:

- El deploy sigue estrictamente el flujo estándar del Release Manager.

Sin salvaguardas:

- No se agregan gates de validación ni planes de respuesta ante contingencias.

Llegada directa:

- El equipo llega al hito 10/10 sin ninguna preparación adicional.

Riesgos Críticos Identificados

Severidad

● Alto

● Alto

● Alto

● Medio

Ruta Reforzada — Deploy en fecha con red de seguridad

Esta opción es recomendada por Salesforce Professional Services y se sostiene en dos pilares.



Gate INT01

Antes de enviar el XML al Equipo de Pasajes, se despliega en INT01 y se ejecuta un smoke test funcional.

INT01 corre la misma versión que Producción hoy – cierra la única brecha de validación existente.



Smoke test lunes 13/10

El 10/10 es sábado – no hay usuarios. Se documenta un script de regresión y se ejecuta el lunes 13/10 antes de la apertura del banco.

El equipo llega al lunes con un plan estructurado, no en modo reactivo.



Horas de esfuerzo adicional

Requerido para la regresión preventiva y coordinación.




Impacto en usuarios

Garantizado durante todo el upgrade del fin de semana.

Plan de Ejecución

Ruta Reforzada – Cronograma detallado de hitos y despliegues

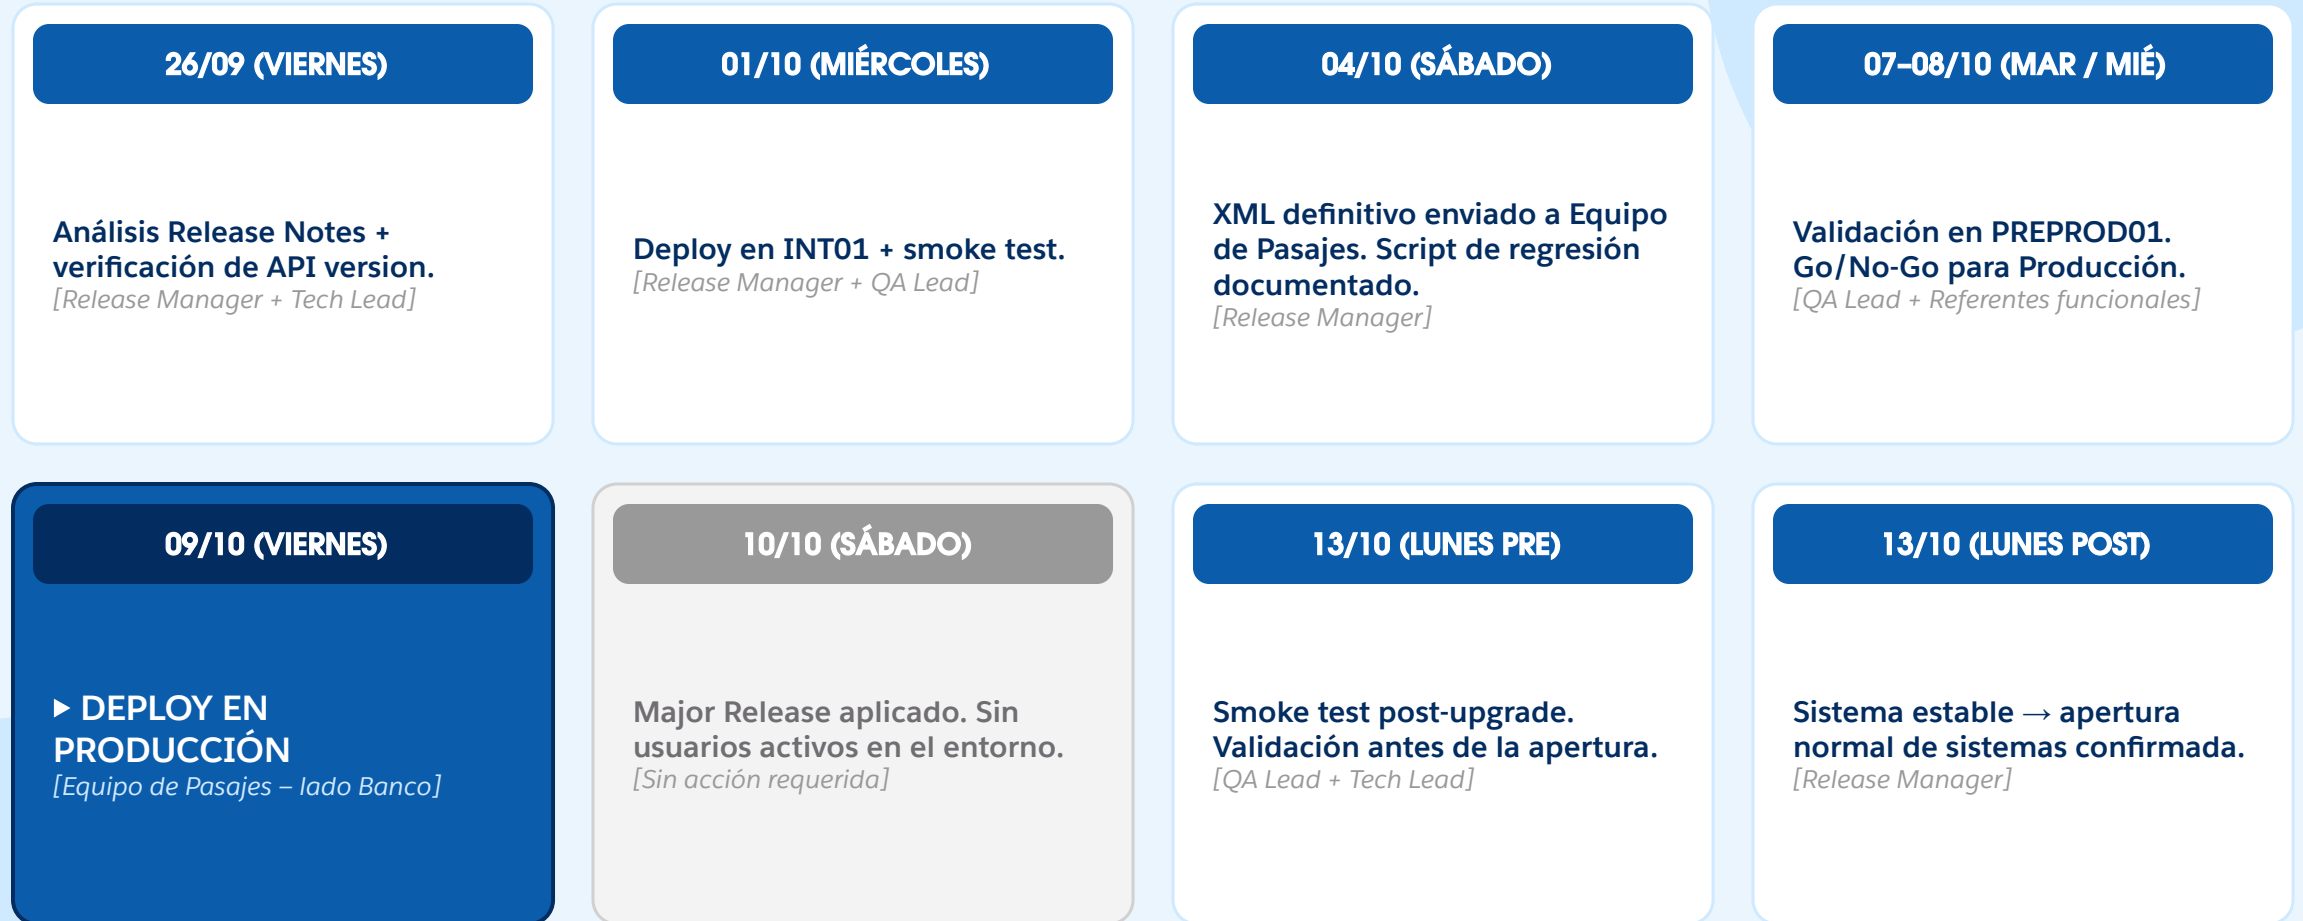

* Los nombres de los responsables deben completarse antes de distribuir.

Ruta Conservadora

Deploy post-Major-Release

¿Cuándo activar?

- El análisis de Release Notes del 26/09 identifica un retiro hard de una feature del deploy.
- El referente técnico del banco decide explícitamente asumir el impacto de cambiar la fecha.

Impacto de activar

- **✗** Rompe el compromiso del 09/10.
- Requiere comunicación formal con justificación técnica.
- Requiere aprobación escrita del referente técnico Banco Macro.
- Deploy el 13/10 con pipeline completamente alineado.



Esta no es una opción de primera elección. Es la salida de emergencia técnica.

Decisión Recomendada

Ejecutar la Ruta Reforzada el 09/10

01

Validación en QA y PREPROD

El deploy ya fue validado en la versión del **Major Release** dentro de QA01 y PREPROD01 (en Preview), testeando de esta manera el escenario más difícil.

02

Cierre de Brecha en INT01

La validación en **INT01** cierra la única brecha pendiente al confirmar el correcto funcionamiento del deploy en la versión exacta de Producción actual.

03

Cero Impacto de Negocio

El fin de semana elimina el impacto operativo. La validación post-upgrade se ejecuta el **lunes 13/10** antes del horario de ingreso de usuarios.

 **Plan de Contingencia:** La Ruta Conservadora se activa **solo si** el análisis del 26/09 revela un retiro hard; en cualquier otro escenario se procederá con la **Ruta Reforzada**.
